График производства земляных работ

№ п/п	Наименование процессов	Ед. изм.	Объем работ	Затраты труда, чел.-дн	Затраты машинного времени, маш.-см	Исполнители	Время выполнения работ: Смены	Время выполнения работ: Дни	Уп.т, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Срезка растительного слоя	1000 м²	150,00	24,38	24,38	Машинист 6 р. - 1	25	13	97,5
2	Рыхление грунта выемок	100 м³	238,76	1,79	1,79	Машинист 6 р. - 1	2	1	89,5
3	Разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом	100 м³	274,57	147,09	147,09	Машинист 6 р. (скреперы, толкач) - 4	37	19	99,4
4	Разравнивание грунта в насыпи	100 м³	292,11	9,86	9,86	Машинист 6 р. - 1	10	10	98,6
5	Уплотнение грунта насыпи катком	100 м³	292,11	9,13	9,13	Машинист 6 р. - 1	10	10	91,3
6	Разработка грунта в котловане с транспортированием в насыпь	100 м³	39,72	61,21	61,21	Машинист 6 р. - 1, Водитель - 5	11	6	92,7
7	Подчистка дна котлована, устройство подсыпки, доставка недостающего грунта в насыпь	1000 м²	1,69	6,17	5,59	Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2 р. - 1, Водитель - 5	1	1	88,2
8	Окончательная планировка площадки	1000 м²	150,00	4,31	4,31	Машинист 6 р. - 1	5	3	86,2
9	Обратная засыпка пазух и съезда песком	100 м³	9,53	25,81	18,16	Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2-3 р. - 4, Водитель - 5	3	2	86,0

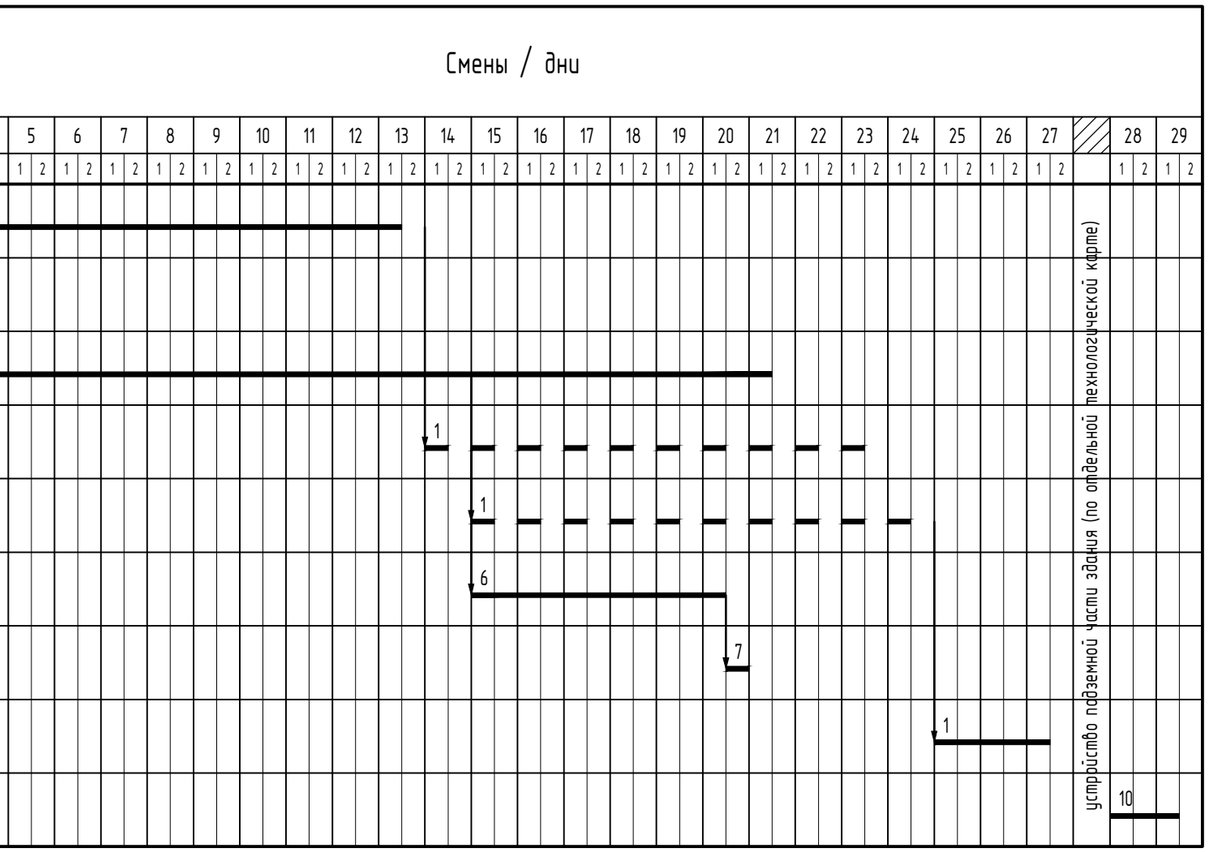

Условные обозначения

4 — работа процесса по сменам, над линией - число исполнителей

— — — работа в одну смену в сутки

↓ технологическая связь процессов

Примечания

1. Затраты труда и машинного времени - по калькуляции (табл. 12, ЕНиР Е2-1); вспомогательные операции включены в основные процессы.
2. Продолжительность t = Тр / n с округлением до целой смены (Тр - трудоемкость, чел.-дн; n - число исполнителей); уровень производительности труда Уп.т = Тр / (n x t) = 86,0-99,4 %.
3. Работы ведутся в 2 смены по 8 ч; разравнивание и уплотнение грунта насыпи - в 1 смену.
4. Продолжительность земляных работ - 29 дней без устройства подземной части здания.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	8	
График производства земляных работ	Кафедра технологии и организации строительного производства		
